REZONANS

Тел. : (351) 731-30-00, эл. почта: rez@rez.ru, www.rez.ru
ул. Нахимова, д. 19п, г. Челябинск, 454119

Опросный лист

для крана-трубоукладчика

1. Тип и марка трубоукладчика: _____
2. Завод-изготовитель трубоукладчика: _____
3. Напряжение бортовой сети: _____
4. Указать следующие параметры:

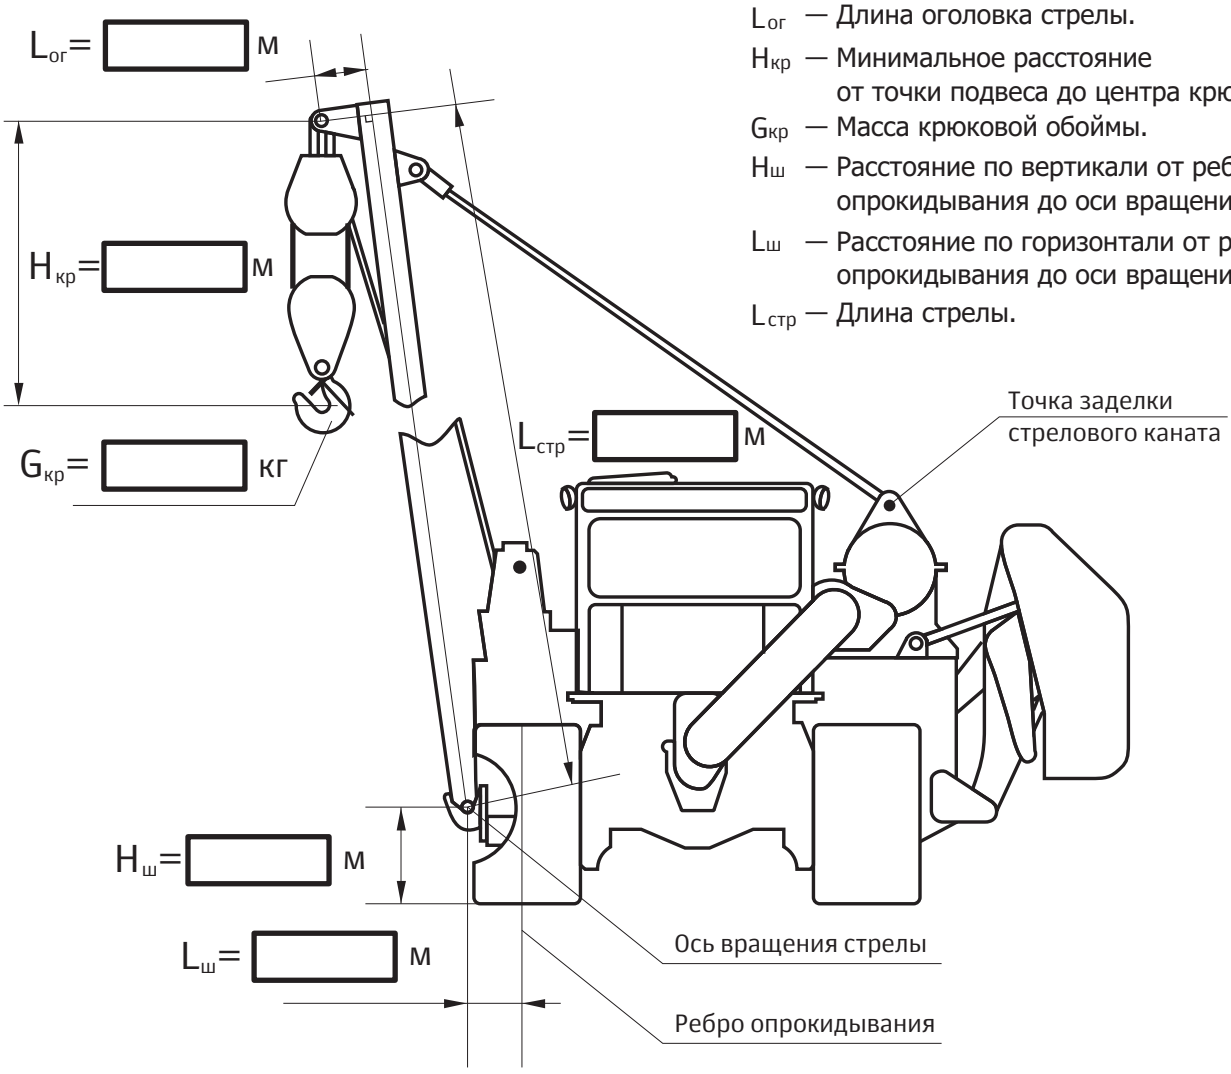

$L_{ог}$ — Длина оголовка стрелы.
$H_{кр}$ — Минимальное расстояние от точки подвеса до центра крюка.
$G_{кр}$ — Масса крюковой обоймы.
$H_{ш}$ — Расстояние по вертикали от ребра опрокидывания до оси вращения стрелы.
$L_{ш}$ — Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания до оси вращения стрелы.
$L_{стр}$ — Длина стрелы.

5. Обрабатывать следующие дискретные сигналы

- ☐ концевой выключатель предельного подъема;
- ☐ концевой выключатель барабана лебедки (концевик «последнего витка»);
- ☐ концевой выключатель положения противовеса;
- ☐ другое: _____

6. Исполнение блока индикации: ◯ встраиваемое ◯ отдельно стоящее

Требуется ли блок индикации с GSM-GPS модулем? ◯ Да ◯ Нет

7. Указать место установки и тип датчика усилия:

◯ Датчик усилия растяжения на подвесном блоке полиспастной системы грузового каната

◯ Датчик усилия изгиба у точки заделки стрелового каната
Указать диаметр каната _____

◯ Датчик усилия изгиба у точки заделки грузового каната
Указать диаметр каната _____

◯ Датчик усилия сжатия на подвесном блоке полиспастной системы грузового каната

8. Указать диапазон измерения усилия: ◯ от 0 до 1000кгс ◯ от 0 до 5000кгс

9. Дополнительные функции, выполняемые прибором:

☐ контроль продольного и поперечного наклонов трубоукладчика;
☐ сигнализация опасного приближения к ЛЭП;
☐ блокировка при достижении предельного угла подъема стрелы;
☐ блокировка при достижении предельного угла опускания стрелы;
☐ регистрация параметров работы («черный ящик»);
☐ диагностика состояния трубоукладчика (непрерывный контроль температур, давлений, скоростных режимов работы трансмиссии, двигателя и т.п.);
☐ другое: _____

_____

10. Указать длины соединительных жгутов по трассе их прокладки от блока индикации (устанавливается в кабине крановщика) до:

– датчика угла наклона стрелы (устанавливается на стреле); _____ м
– датчика продольного и поперечного наклонов (устанавливается на раме трубоукладчика); _____ м
– датчика приближения к ЛЭП (устанавливается на оголовке стрелы); _____ м
– датчика усилия (устанавливается на подвесном блоке полиспастной системы или у точки заделки стрелового каната); _____ м
– концевого выключателя положения противовеса; _____ м
– концевого выключателя барабана лебедки. _____ м

11. По умолчанию климатическое исполнение У2 по ГОСТ 15150-69, если требуется иное, необходимо указать _____

К опросному листу должны быть приложены:

1. Общий вид трубоукладчика (фотографии или чертежи общего вида).
2. Грузовые характеристики во всех режимах работы трубоукладчика (с откинутым и придвинутым противовесом, работа в колонне и т.п.).
   Уточнить входит ли масса крюка в массу поднимаемого груза в таблице грузовых характеристик.
3. Используемые схемы запасовки грузового и стрелового канатов.
4. Электрические схемы электрооборудования трубоукладчика с перечнем элементов.
5. Схему гидросистемы трубоукладчика.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие ООО НПП «Резонанс» (далее –оператор) расположенному по адресу: ул. Нахимова, д. 19п, г. Челябинск, 454119, на обработку персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации.

Заполнил _____ _____ _____
Ф. И. О. подпись дата

Название предприятия _____

Адрес и телефон _____

_____
